


**HOPE UNIVERSITY COLLEGE**  
**ADDIS ABABA**  
**ETHIOPIA**

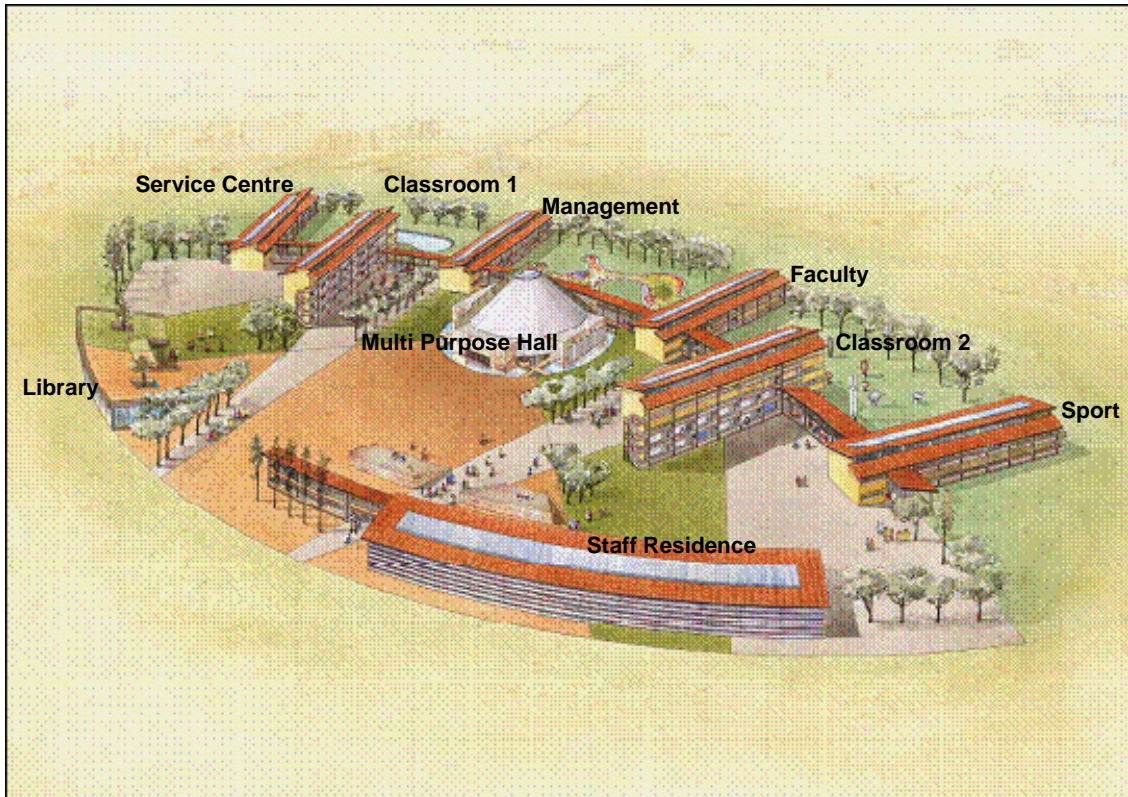

**PROGRESS REPORT**

**Project** : Construction of Hope University College  
**To** : Dr. Minas, Building Consortium (Holland), Ethiopiaid UK,  
Menlo Park (USA), Ethiopiaid Ireland  
**Date** : 1 September 2008  
**Prepared by** : Niek Hoffius

---

### Service Centre



Block laying is almost finished and plasterwork has begun, as well as the erection of the railing along the first floor and the stairs. Erection of the roof will begin the coming week.

*Het metselwerk is bijna gereed en men is begonnen met het pleisterwerk, evenals de montage van de leuningen op de eerste verdieping en de trappen. De montage van het stalen dak zal de komende week aanvangen.*

## Classroom Building 1



The concrete roof beams are almost finished and block laying on the second floor has begun.

*De betonnen dakbalken zijn bijna gereed en het metselen van de betonblokken op de eerste verdieping is begonnen.*



In the foreground the **Management Building** with the **Faculty Office** in the middle and the second **Classroom Building** in the background.

This picture was taken from the fourth floor of the first classroom building.

*Op de voorgrond het **Management Building** met de **Faculty Office** in het midden en het tweede **Classroom Building** op de achtergrond.*

*Deze foto is genomen vanaf de derde verdieping van het eerste classroom building.*



**Classroom Building 2**

The fixing of reinforcing steel is ready and the second floor can be cast.

*Het vlechtwerk van het betonstaal is gereed en de tweede verdieping kan gestort worden.*



### **Knowledge Centre (Library)**

The formwork to the sloped roof (one third of the formwork is ready) under construction with at the left (the horizontal part) the future entrance to the library.

After finishing the concrete roof, a layer of 600 millimetres (approximately 24 inches) of earth will be applied, this will be sown in with grass and or other vegetation.

*De bekisting van het schuine dak (één derde van de bekisting is gereed) in aanbouw met aan de linkerzijde (het horizontale gedeelte) de ingang tot de bibliotheek.*

*Nadat het betonnen dak gereed is, zal er een laag van 600 mm aarde worden aangebracht, die zal worden ingezaaid met gras en of andere vegetatie.*



**Staff Residence Building**

This picture was also taken from the fourth floor of the classroom building.  
The blinding concrete to the first floor is finished and in the middle steel fixers can be seen fixing the reinforcement.

*Deze foto is ook genomen van de derde verdieping van het classroom gebouw.  
De werkvloer van de begane grond is gereed en in het midden kunnen de vlechters worden gezien, die bezig zijn met het vlechten van de wapening.*
