


HOPE UNIVERSITY COLLEGE
ADDIS ABABA
ETHIOPIA

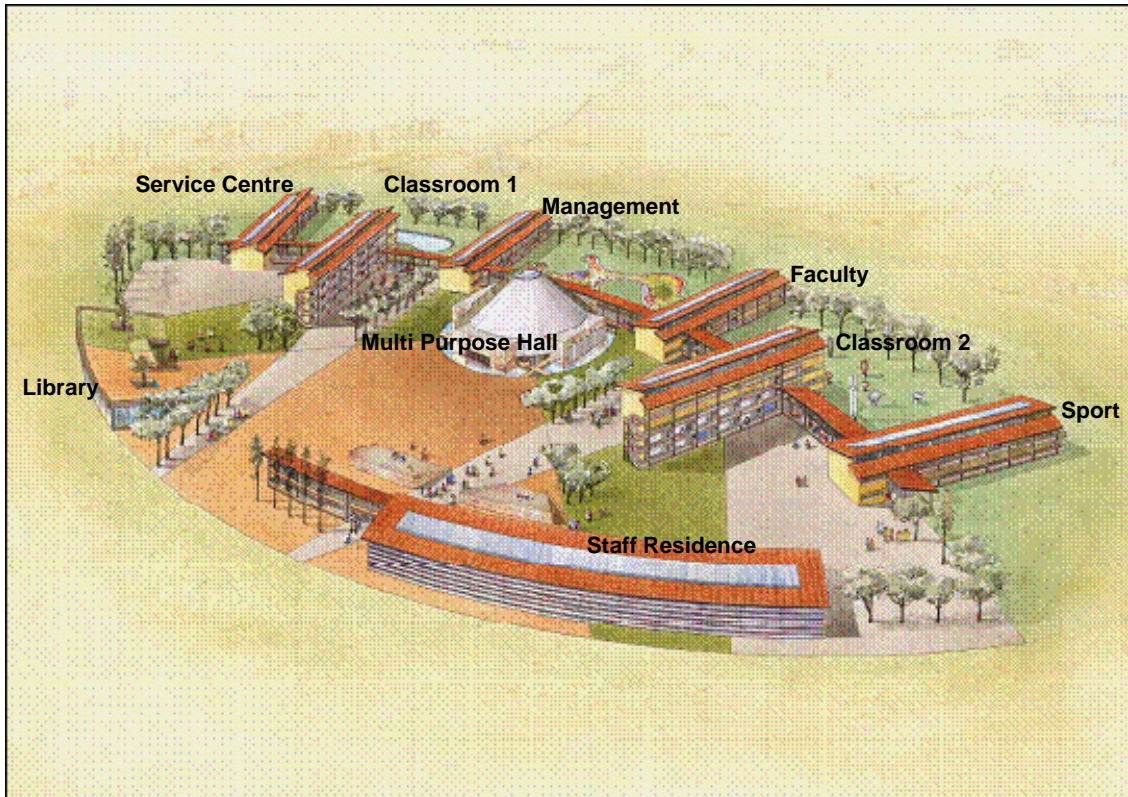

PROGRESS REPORT

Project : **Construction of Hope University College**

To : **Dr. Minas , Building Consortium (Holland), Ethiopiaid UK,
Menlo Park (USA), Ethiopiaid Ireland**

Date : **9 May 2008**

The following pictures, taken on 6 May, show the progress of work until that date.

De volgende foto's zijn genomen op 6 mei en laten de voortgang van het werk tot die datum zien.



Service Center

This building consists of two layers. The ground and first floors have been cast. The ring beam, which will support the roof, is ready.

Dit gebouw bestaat uit twee lagen. De begane grond- en de eerste verdiepingvloer zijn gestort.

De ringbalk, die het dak moet ondersteunen, is gereed



Classroom Building 1

The two classroom buildings each consist of a ground floor with three floors above. On this picture the ground floor and the first floor are ready and the steel fixers are busy fixing the reinforcement of the second floor. After steel fixing is finished, the second floor slab can be poured.

De twee college gebouwen bestaan elk uit een begane grondvloer met daarboven drie verdiepingen.

Op deze foto zijn de begane grondvloer en de eerste verdieping gereed en zijn de vlechters bezig om de wapening van de tweede verdieping te vlechten. Nadat het vlechtwerk gereed is, kan de tweede verdiepingvloer gestort worden.



Management Complex

This building too consists of two layers, a ground floor and a first floor. The ground floor slab has been cast and the shuttering to the first floor slab is ready. Steel fixers are busy with the reinforcement steel.

Ook dit gebouw bestaat uit twee lagen, een begane grondvloer en eerste verdieping De begane grondvloer is gestort en de bekisting voor de verdiepingsvloer is gereed. Vlechters zijn bezig met het wapeningsstaal.



Faculty Office

At this stage the groundfloor slab is ready and the carpenters are erecting the formwork of the columns underneath the first floor.

Op dit moment is de begane grondvloer gereed en de timmerlieden zijn bezig om de bekisting van de kolommen onder de eerste verdiepingsvloer te maken.



Classroom Building 2

The columns underneath the first floor are in progress and almost finished.

De kolommen onder de eerste verdieping zijn bijna gereed.



Knowledge Centre (Library)

The groundfloor slab is almost finished and the contractor is already busy with the construction of the columns.

De begane grondvloer is bijna gereed en de aannemer is reeds bezig met de constructie van de kolommen.



Staff Residence Building

Foundation slabs and columns underneath the groundfloor slab are being poured.

Funderingspoeren en kolommen onder de begane grondvloer worden gestort.
