


**HOPE UNIVERSITY COLLEGE**  
**ADDIS ABABA**  
**ETHIOPIA**

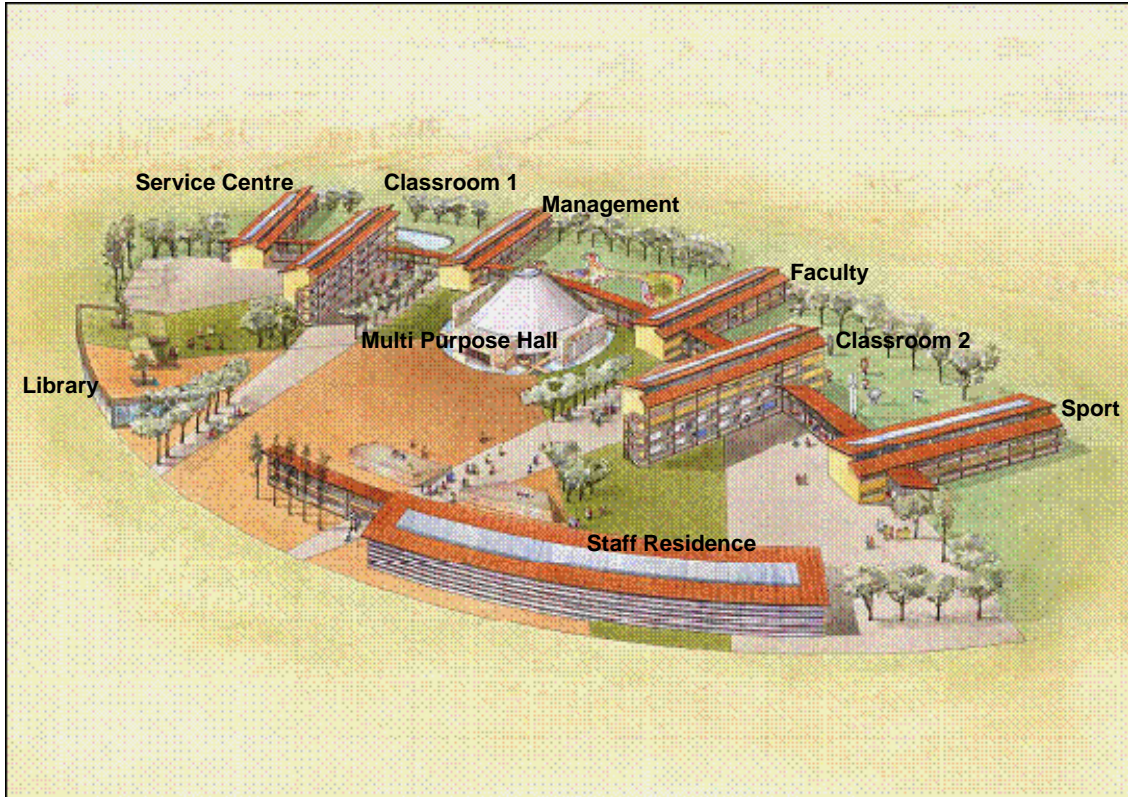

**PROGRESS REPORT**

**Project** : **Construction of Hope University College**  
**To** : **Dr. Minas, Building Consortium (Holland),  
Ethiopiaid UK, Menlo Park (USA), Ethiopiaid  
Ireland**  
**Date** : **5 June 2008**  
**Prepared by** : **Niek Hoffius**

---

The following pictures, taken on 5 June 2008, show the progress of work until that date.  
*De volgende foto's zijn genomen op 5 juni en laten de voortgang van het werk tot die datum zien.*



#### **Service Center**

This building consists of two layers. The ground and first floors have been cast.  
The ring beam, which will support the roof, is ready.  
Brickwork to the walls is to start soon.

*Dit gebouw bestaat uit twee lagen. De begane grond- en de eerste verdiepingvloer zijn gestort.*

*De ringbalk, die het dak moet ondersteunen, is gereed.*

*Metselwerk van de wanden zal binnenkort beginnen.*



**Classroom Building 1**

The two classroom buildings each consist of a ground floor with three floors above. At this stage the ground floor, the first and the second floor are ready and the columns underneath the third floor are in progress.

*De twee college gebouwen bestaan elk uit een begane grondvloer met daarboven drie verdiepingen.*

*Op deze foto zijn de begane grondvloer, de eerste en de tweede verdiepingvloer gereed en is men bezig met de kolommen onder de derde verdieping.*



**Management Complex**

This building too consists of two layers, a ground floor and a first floor. The ground floor and the first floor are ready and the carpenters are busy erecting the shuttering to the ring beam supporting the roof.

*Ook dit gebouw bestaat uit twee lagen, een begane grondvloer en een eerste verdieping. De begane grondvloer and de eerste verdiepingvloer zijn gereed en de timmerlieden zijn bezig met de bekisting voor de ringbalk, die het dak ondersteunt.*



**Faculty Office**

The faculty office, like the service center and the administration building, consists of two layers, a ground floor and a first floor.

At this stage the ground floor slab and the columns underneath the first floor are almost ready.

*Ook dit gebouw bestaat, net als het service center en het administratie gebouw, uit twee lagen, een begane grondvloer en een eerste verdieping.*

*Op dit moment zijn de begane grondvloer en de kolommen onder de eerste verdieping bijna gereed.*



**Classroom Building 2**

The carpenters are busy with the formwork to the first floor.

*De timmerlieden zijn bezig met de bekisting van de eerste verdieping.*



### **Knowledge Centre (Library)**

The carpenters and steel fixers are busy with the mezzanine floor.

*De timmerlieden en de vlechters zijn bezig met de tussenverdieping.*



**Staff Residence Building**

Foundation beams to half the building are ready and the excavations of the foundation slabs of the other half are being backfilled.

The fundatiebalk van de helft van het gebouw is gereed, de ontgravingen van de funderingspoeren van de andere helft worden aangevuld.
